

X
X
X

Sagsbeh.: Lars Hagbarth
Tlf: 55 35 37 22 / 40 41 51 33
e-mail:
laha@vordingborgforsyning.dk

www.vordingborgforsyning.dk

Vor. Info 7 om fjernvarme til Ørslev til
ref. tilmeldte ejendomme

19. juli 2022

Information om fjernvarmeprojektet i Ørslev.

Vi har nu været i gang i ca. ½ års tid og projektet går nogenlunde, som vi har planlagt. Men vi er udfordret af hele situationen i Europa, som specielt vanskeliggør leverancer af fjernvarmerør. Indtil nu er det lykkedes at få rørene leveret, men om det fortsætter, kan vi kun gisne om.

Arbejdet har selvfølgelig medført gener i områder, hvor vi graver. Vi gør alt, hvad vi kan for at mindske generne, men selvfølgelig sker der fejl undervejs. Det skal vi selvfølgelig beklage. Vi har i samråd med hovedentreprenørfirmaet MSE A/S fået erstattet den underentreprenør, som stod for stikledningsarbejdet, med en anden. Vi var absolut ikke tilfreds med denne underentreprenør, som på ingen måde levede op til den standard, vi efterspørger i forhold til gennemførelse af arbejdet og opførsel.

I altid velkommen til at tage fat i entreprenøren på stedet, som vil være det nemmeste eller kontakte os.

Det er planen, at vi i løbet af september/oktober 2022 vil opstarte opsætningen af fjernvarmeunits i boligerne, så der kan ske en omkobling til fjernvarme. Her vil man opleve, at vi ikke fra starten følger den etapeplan, som vi har fulgt indtil videre. Det er et teknisk problem, som gør, at det ikke vil være de ejendomme, som først fik gravet fjernvarmestik ind på ejendommen, som også først får units monteret. Vi har lagt en plan og alle vil blive kontaktet af en VVS-montør, når tiden nærmer sig for montering af fjernvarmeunits i ejendommen.


Når der er monteret fjernvarmeunits og der kan aftages varme, skal I selv afmelde levering af gas samt afkobling. Der kan kun gøres af jer som husejer og der skal benyttes NemID eller MitID. Det gøres på flg. hjemmeside: <https://evida.dk/frakobling/>.

Lige nu holdes der sommerferie. Der vil være folk i gang men i begrænset omfang. På vores hjemmeside kan man se etapeplanen, eller på bagsiden af dette brev med en overordnet tidsplan. Det skal dog nævnes at etape 5 (Elmevej, Lindevej og Søndervej) udskydes, da der her er andre graveplaner i form af kloak. Men ellers er planen at etaperne 4, 6, 7 og 8 udføres resten af 2022 og 9 og 10 start 2023. Hele projektet forventes afsluttet med udgangen af 2023 eller start 2024. Der tages dog forbehold for tidsplanen som følge af situationen i Europa og andre uforudsete forhold

Med venlig hilsen



Lars Hagbarth
Projektleder

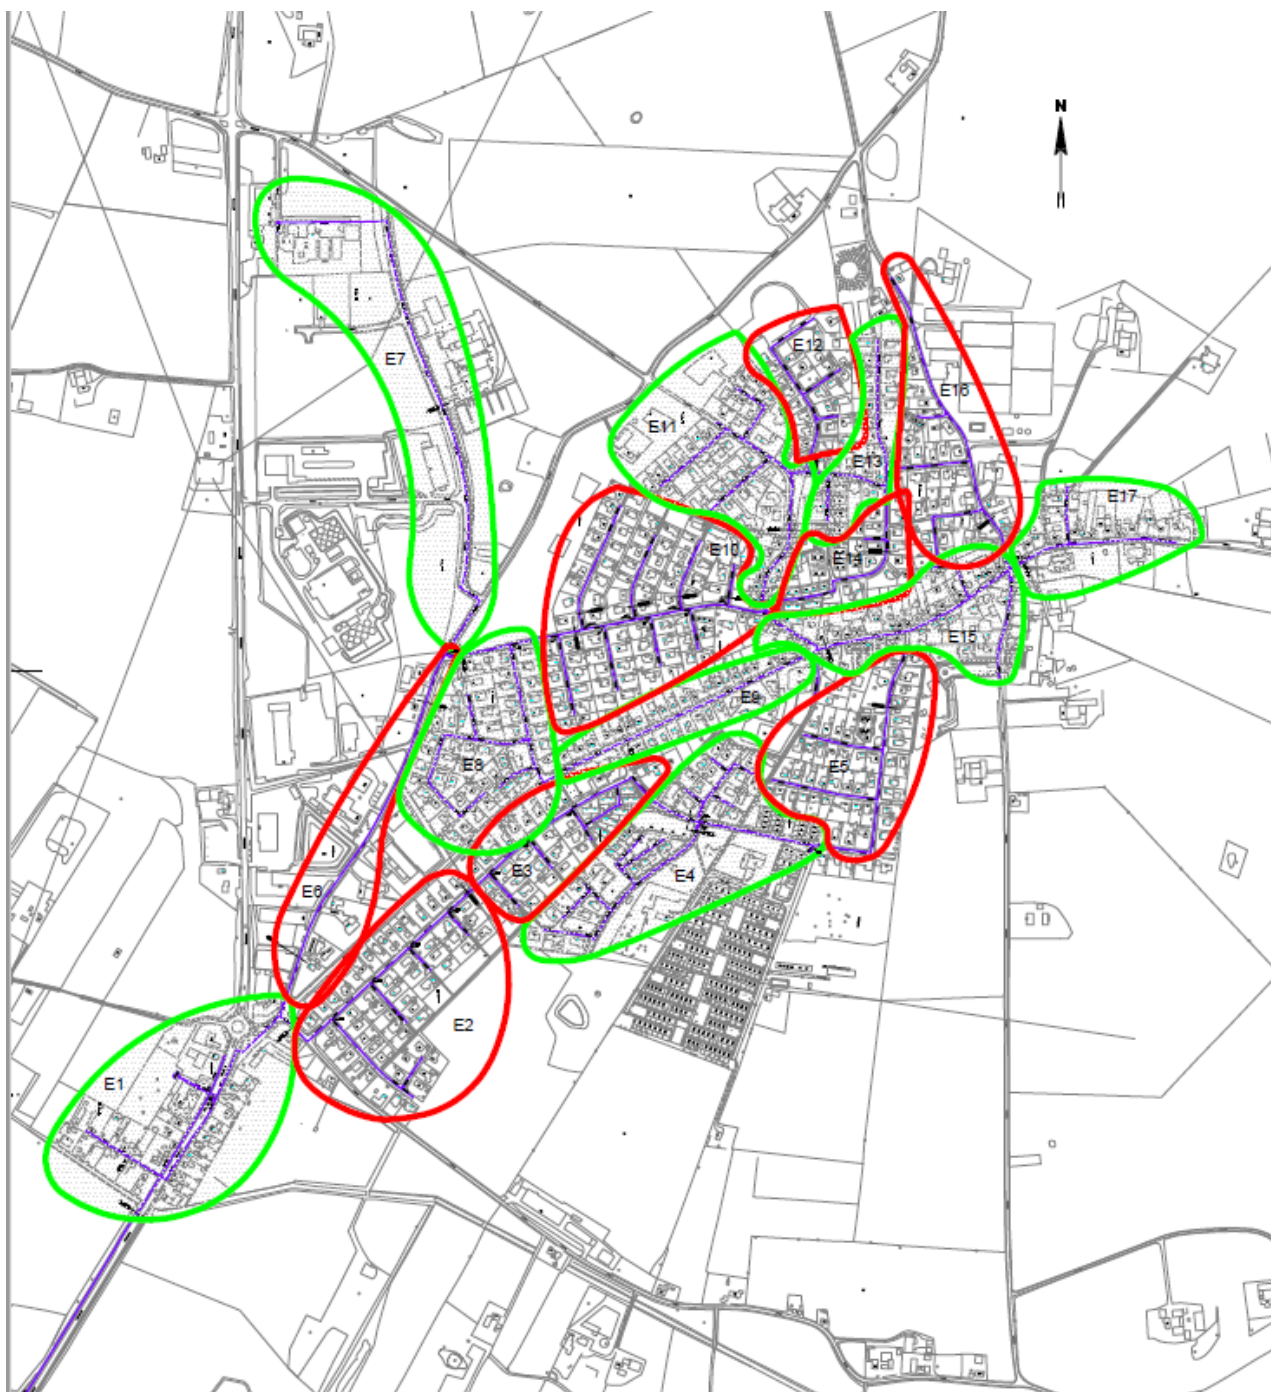

Der er ikke forskel på om en etape er markeret med grøn eller rød, det er kun for at skille dem ad.

Etaper	Udførelse
1, 2 og 3	I gang
4, 6, 7, 8	Andet halvår 2022
9, 10, 11 og 12	Første halvår 2023
13,14, 15, 16 og 17	Andet halvår 2023 og første halvår 2024
5	Ikke fastsat

Med forbehold for uforudsete forsinkelser (f.eks. levering af rør).

Antallet af tilmeldte ejendomme er p.t ca. 400, hvilket er en stigning fra 300 i forhold til, da vi påbegyndte projektet. Dette medfører også en forskydning i tidsplanen, da der nu skal graves 30 % flere fjernvarmestik.
